


Проверка законности, эффективности и целесообразности использования бюджетных средств, выделенных на благоустройство общественных территорий города Читы в рамках реализации государственной программы Забайкальского края «Формирование современной городской среды»

ЦЕЛЬ: правомерное использование средств на благоустройство площади Труда, достижение результата

Благоустройство площади Труда, проект

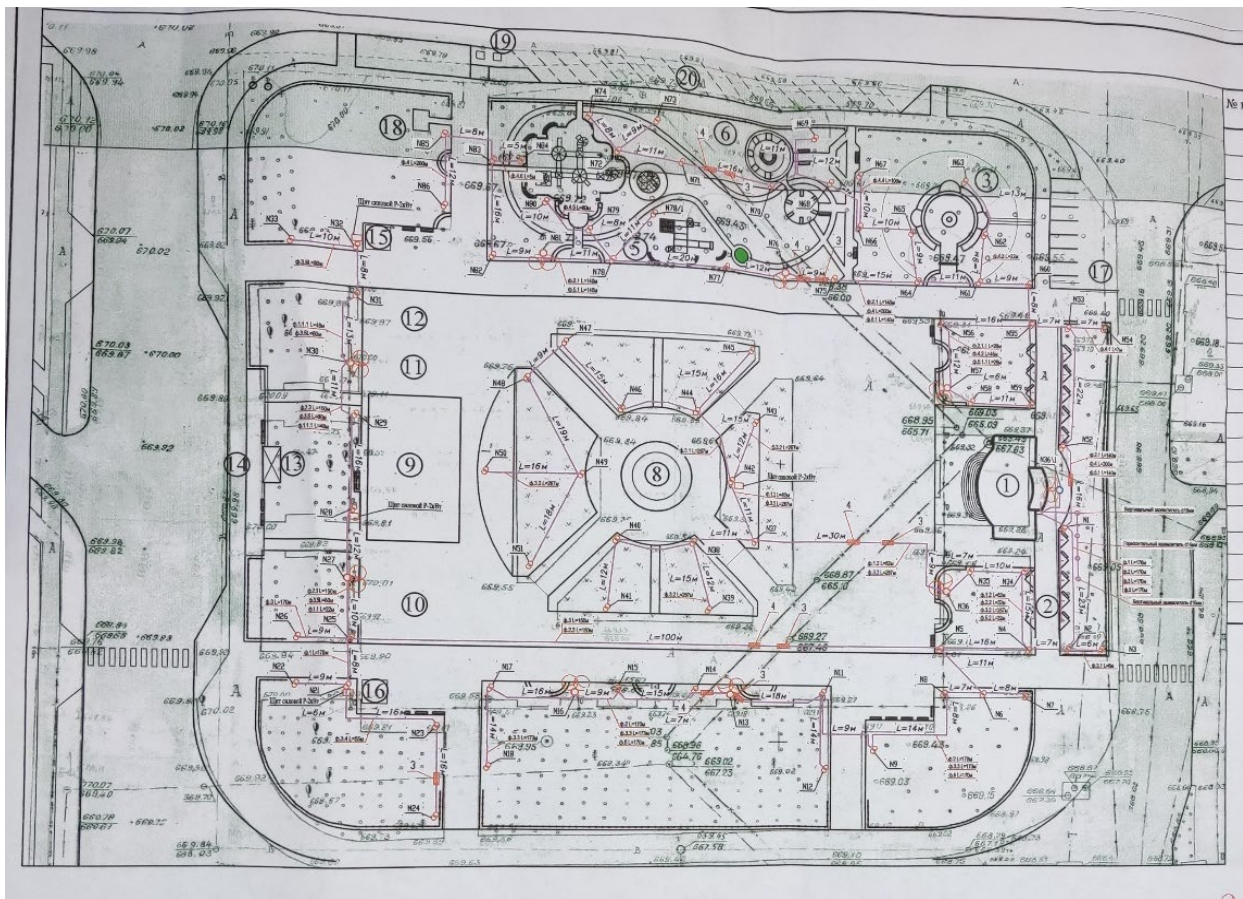

$S = 11\,331,8$ кв. метров

цена – 65,7 млн. рублей
подрядчик - ООО «МСС»

начало работ – октябрь 2019
завершение – октябрь 2020

гарантия – 5 лет

Площадка молодежи



по проекту - по периметру мелкая плитка со ступенькой шириной 0,55 м.
с островками под скамейки из широкой плитки



визуализация проекта
несколько секций
в проходе

Площадка молодежи

по факту – одна секция
на островке






по проекту - 16 билбордов
сити-формата

Аллея трудовой славы

по факту - стенды
и доп. расходы



Игровая площадка для детей

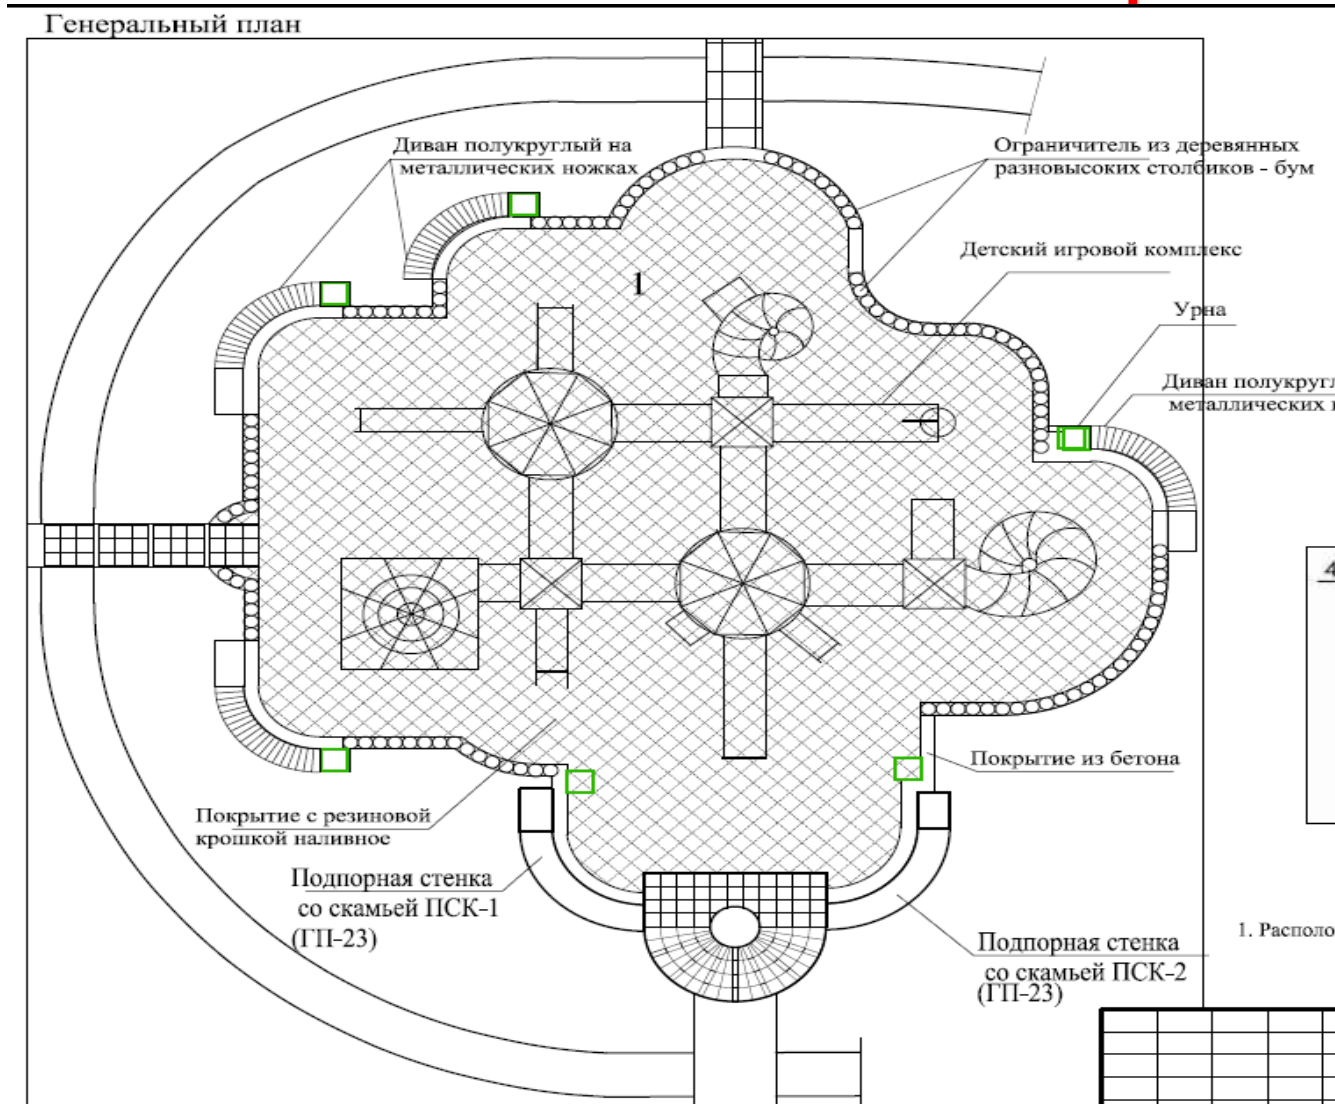

по проекту ограничитель
из деревянных
столбиков - бум



по проекту 2 биотуалета
с кабиной «Калифорния»

Ущерб бюджету составил 12,0 млн. рублей:

5,1 млн. рублей принято и оплачено не выполненных работ

6,8 млн. рублей принято и оплачено работ, не предусмотренных муниципальным контрактом

40,1 тыс. рублей оплачено непредвиденных расходов без обоснования, т.е. без расшифровки расходов

5,2 тыс. рублей оплачено непредвиденных работ с превышением лимита в 2% резервных средств СМР




в нарушение ст. 219 БК РФ Комитетом ненадлежащим образом исполнены полномочия получателя бюджетных средств



Тротуарная плитка




Тротуарная плитка

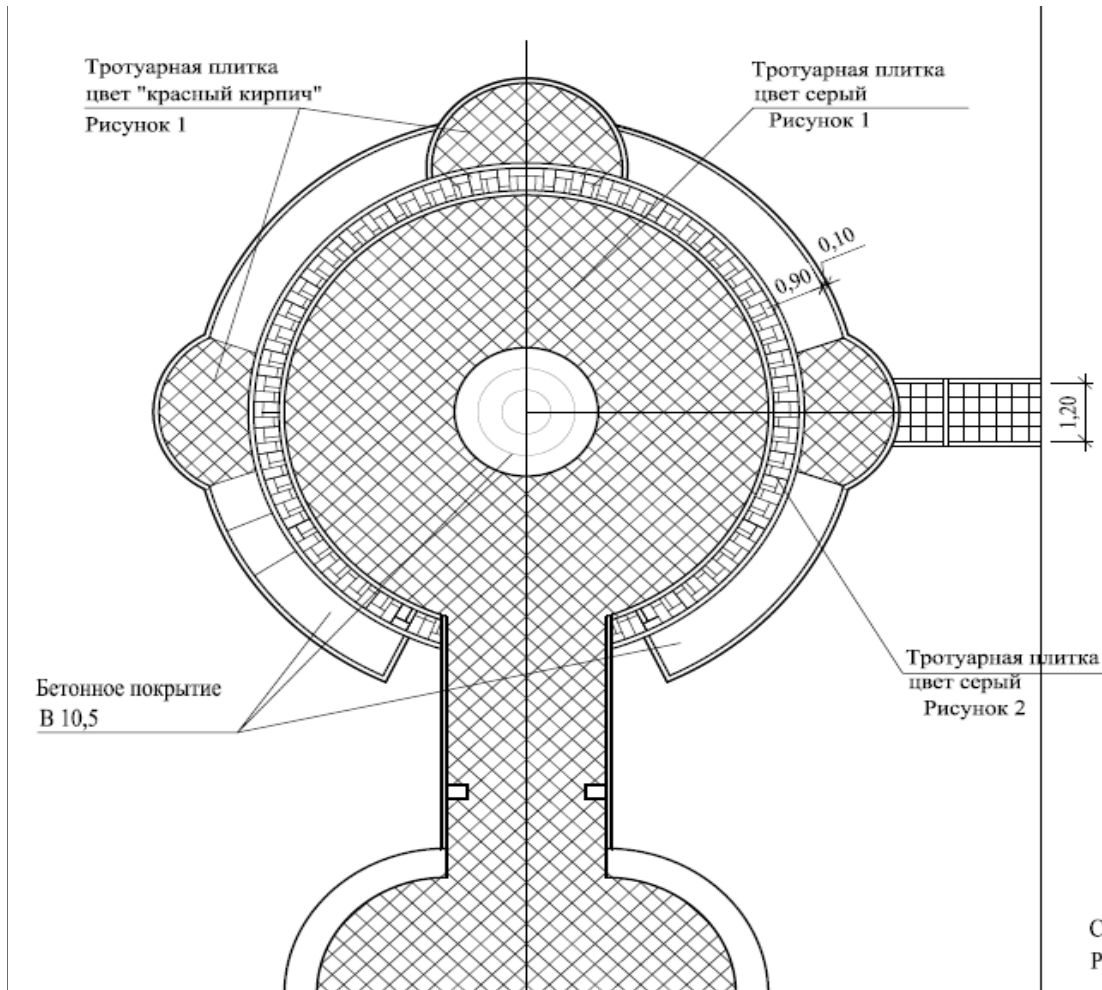

по проекту - серая плитка
под углом 45 градусов



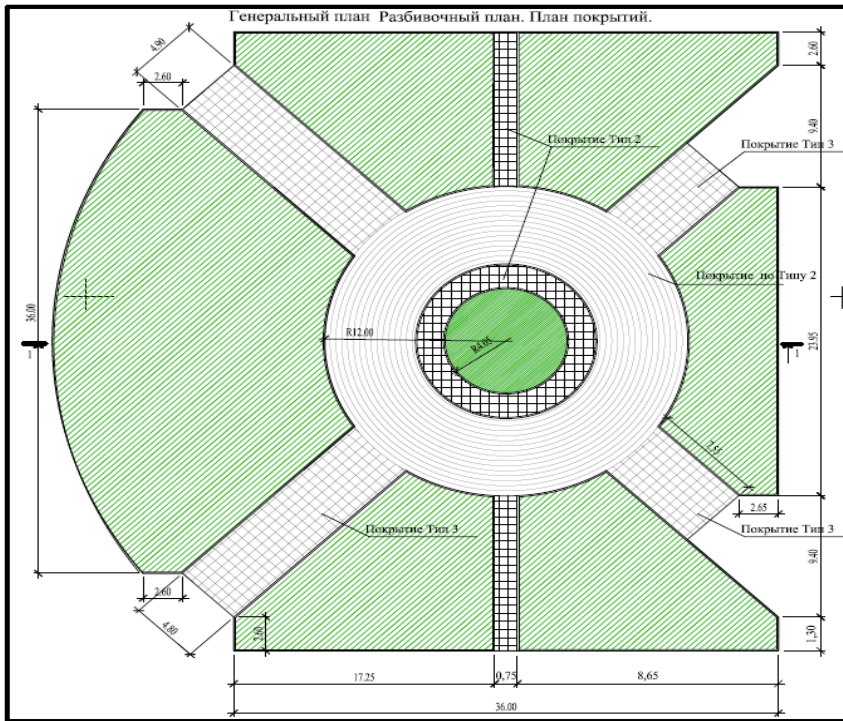

Цветочный газон



разрушено
89 бордюров
на 117,0 тыс.
рублей


Синтетическое покрытие



Сцена



Подпорная стенка
со скамьей ПСК-5
(П)

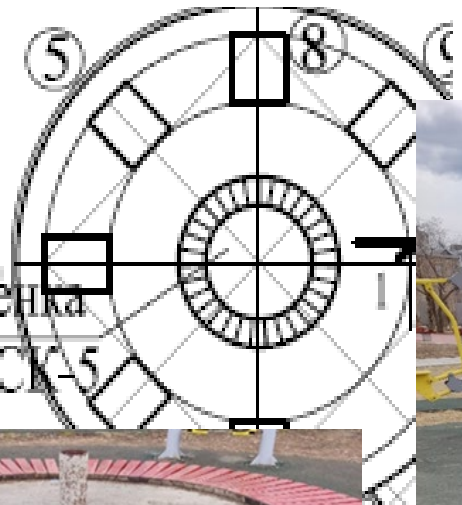

Нарушения законодательства в сфере контрактной системы:

- приемка выполненной работы или отдельного этапа исполнения контракта исполнялась при несоответствии этих работ условиям контракта
- не размещена информация в ЕИС (дополнительные соглашения, дополнительный локальный сметный расчет, приложения к техническому заданию и др.)
- не своевременная оплата выполненных работ
- не указана дата подписания актов со стороны заказчика

Ключевые выводы:

- ◆ установлен ряд существенных нарушений и недостатков при исполнении Комитетом возложенных полномочий
- ◆ мероприятия государственной программы формирования современной городской среды на площади Труда, КСК г. Читы реализованы недостаточно эффективно

Предложения Администрации города Читы:

- ◆ поручить Комитету городского хозяйства устранить выявленные нарушения и недостатки
- ◆ принять меры по обеспечению эффективного использования бюджетных средств

Меры реагирования:

- ◆ Направить отчет:
 - в Законодательное Собрание и в Правительство Забайкальского края для сведения
 - в Администрацию ГО «Город Чита» для рассмотрения и принятия мер
 - в Прокуратуру Забайкальского края
 - в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Забайкальскому краю

- ◆ Направить информационное письмо в Министерство финансов Забайкальского края

Спасибо за внимание!
